

Panduan Lengkap Project Manager & Produser

Mencakup alur lengkap: Brief → Quotation → Approval → Forecast Budget Pengajuan Pembayaran → Invoice → Selesai

Versi 2.0 · Juni 2026

DAFTAR ISI

1. Gambaran Sistem
2. Alur Kerja Utama: Brief → Quotation → Done
3. Membuat Project Baru
4. Status Project & Kapan Mengubahnya
5. Manajemen Task
6. **ALUR QUOTATION — Penawaran ke Klien**
 - › Apa itu Quotation?
 - › Membuat Quotation
 - › Alur Approval Quotation (Draft → Disetujui Direktur)
 - › Quotation Add Cost
 - › Revisi Quotation yang Sudah WON
7. **FORECAST BUDGET — Rencana Kebutuhan Dana**
 - › Mengapa Forecast Penting?
 - › Sinkronisasi Otomatis dari Quotation
 - › Menambah & Mengedit Item Forecast
 - › Kategori Pengeluaran
 - › Titipan Klien
8. **PENGAJUAN PEMBAYARAN (Payment Request)**
 - › Cara Membuat Payment Request
 - › Alur Approval PR: PM → Direktur Divisi → Direktur Finance
 - › Status PR & Artinya
 - › Tips agar Pembayaran Cepat Diproses
9. Tim Project
10. Client Brief
11. Catatan Evaluasi Tim
12. Vendor & Klien
13. Piutang & Invoice
14. Penilaian Tim

15. Dashboard & Workload

16. Tips & Referensi Cepat

1. Gambaran Sistem

Watermark PM adalah sistem manajemen project internal yang mencakup semua tahapan operasional — dari brief masuk, pitching, pelaksanaan event, hingga penagihan dan evaluasi.


Modul	Fungsi Utama
Projects	Pusat kendali: task, budget, tim, dokumen, evaluasi
Quotation	Buat & kelola penawaran harga kepada klien — terintegrasi dengan Forecast Budget
Invoice	Kelola penagihan kepada klien
Finance	Piutang, laporan margin, rekap forecast keuangan
Vendor	Database vendor dengan riwayat kerja sama & rating
Klien	Database klien dan histori project
Penilaian	KPI bulanan & penilaian per-project
Workload	Monitoring beban kerja tim secara real-time

Divisi:

- Event (EO) — Meeting & Conference, Activation, Launching, Exhibition, Incentive & Gathering, Sponsorship
- Production House (PH) — Corporate Profile, Commercial, Event Documentation, Social Media Content, Training Video, Motion Graphic

2. Alur Kerja Utama: Brief → Quotation → Done

Berikut adalah gambaran besar alur kerja dari pertama kali brief masuk hingga project selesai. Detail setiap tahapan ada di bagian masing-masing.

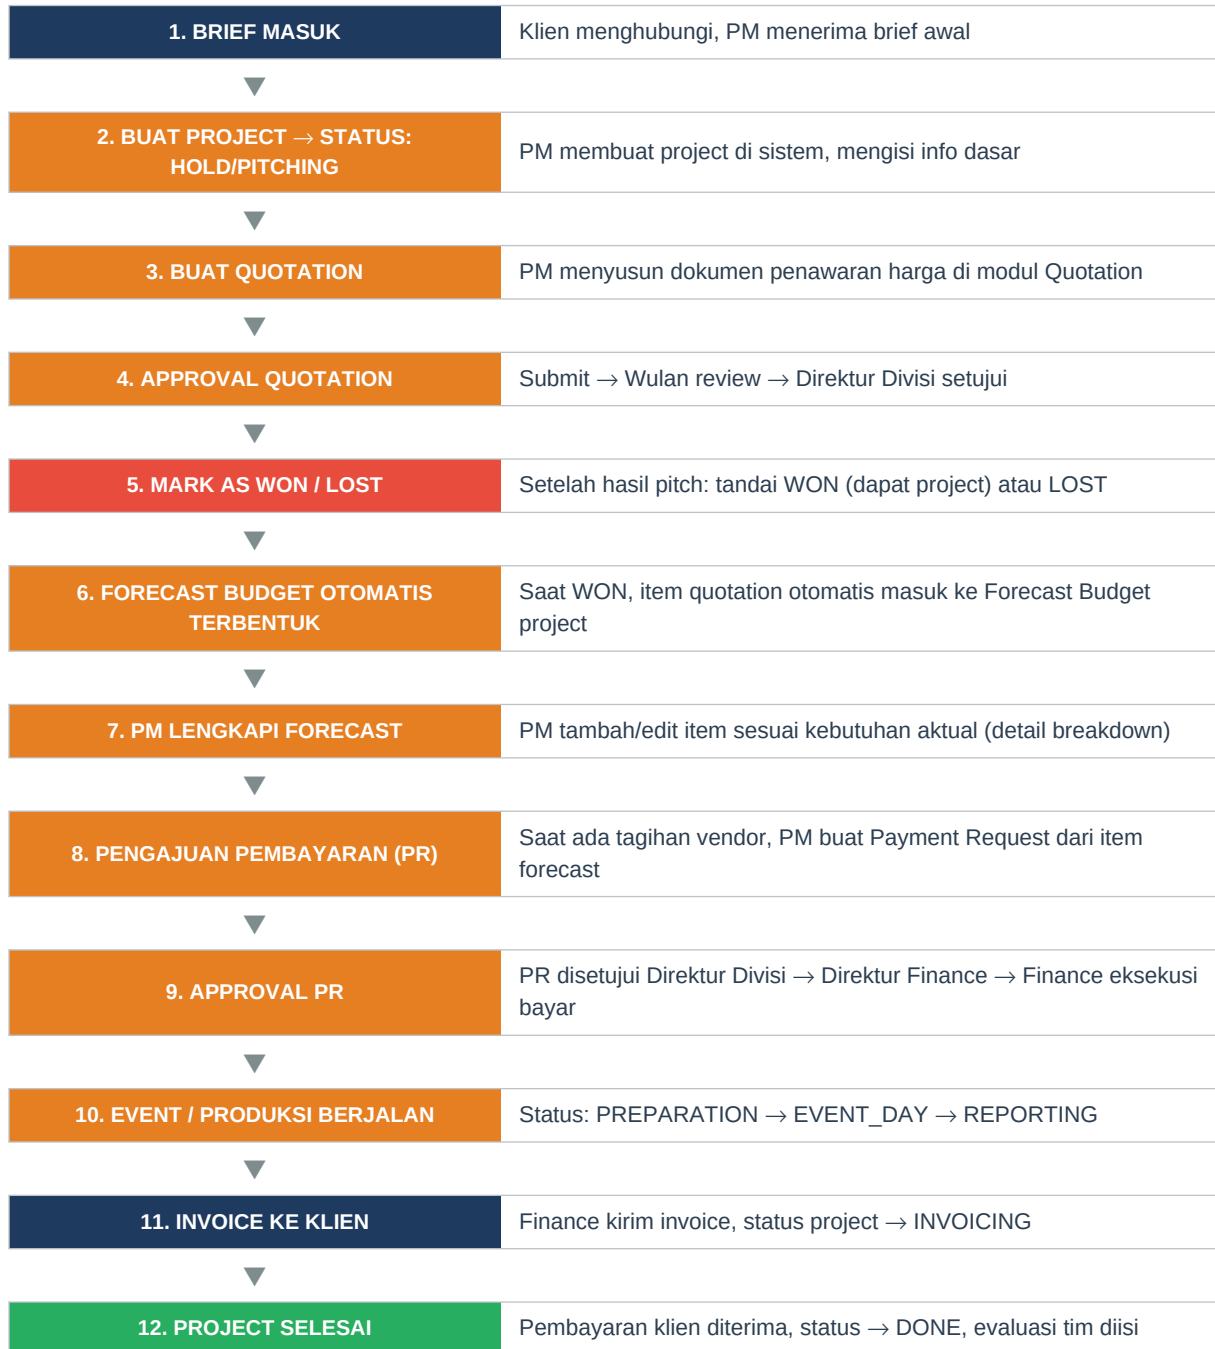

3. Membuat Project Baru

Field wajib saat membuat project:
• Nama Project — nama event/produksi yang deskriptif
• Divisi — EVENT atau PH (menentukan jenis sub-kategori)
• Sub-kategori — jenis event/produksi (pilih dari dropdown)
• PIC (Project Manager yang bertanggung jawab)
• Tanggal event / jadwal produksi

Field	Keterangan	Wajib?
Nama Project	Nama event/produksi	✓
Divisi	EVENT atau PH	✓
Sub-kategori	Jenis event/produksi	✓
PIC	PM yang bertanggung jawab	✓
Client Name	Nama klien (bisa diisi belakangan)	
Tanggal Event	Jadwal pelaksanaan	
Kode Project	Otomatis di-generate sistem	otomatis

4. Status Project & Kapan Mengubahnya

Status	Arti	Kapan pindah ke status ini
HOLD	Brief masuk, belum mulai proses	Saat project pertama dibuat
PITCHING	Sedang menyiapkan proposal/quotation	Saat mulai proses pitch ke klien
WAITING_PITCH_RESULT	Proposal sudah dikirim, menunggu hasil	Setelah proposal/quotation dikirim ke klien
PREPARATION	Project diterima (WON), mulai eksekusi	Setelah konfirmasi WIN dari klien
EVENT_DAY	Hari pelaksanaan event/shoot	Di hari H event atau produksi
REPORTING	Pasca event, menyiapkan laporan	Setelah event/produksi selesai
INVOICING	Invoice sudah dikirim ke klien	Setelah invoice dikirim, menunggu bayar
DONE	Project selesai dan lunas	Setelah pembayaran klien diterima
LOSE	Pitch gagal, project tidak jadi	Saat konfirmasi kalah dari klien
FAILED	Project gagal di tengah jalan	Jarang — hanya untuk kasus darurat
CANCELLED	Project dibatalkan	Saat klien cancel sebelum mulai

5. Manajemen Task

Tab **Task** adalah papan kanban untuk memantau pekerjaan dalam project.

Kolom	Arti
TODO	Task belum dikerjakan
IN PROGRESS	Sedang dikerjakan
REVIEW	Perlu review/persetujuan
DONE	Selesai

Membuat Task

- Klik tombol **+ Tambah Task**
- Isi judul task
- Assign ke anggota tim (bisa lebih dari satu)
- Set deadline jika perlu
- Tambah deskripsi / sub-task jika diperlukan

Priority Task

Priority	Kapan digunakan
LOW	Pekerjaan rutin, tidak mendesak
MEDIUM	Pekerjaan standar
HIGH	Mendesak, harus selesai segera
URGENT	Darurat, butuh perhatian langsung

6. Alur Quotation — Penawaran ke Klien

Quotation adalah **dokumen penawaran harga resmi** yang dikirimkan kepada klien. Di sistem Watermark PM, quotation bukan sekadar dokumen — ia menjadi **dasar otomatis terbentuknya Forecast Budget** project. Karena itu, isi quotation harus sedetail dan seakurat mungkin.

A. Apa itu Quotation?

Komponen	Keterangan
Nomor Quotation	Digenerate otomatis: WTM/EO/QUOT/2026/001
Client & Event	Nama klien, nama event, tanggal, lokasi
Seksi & Item	Daftar komponen biaya per seksi (A, B, C, ...)
Agency Fee	Persentase fee (jika ada)
PPN	Pilihan include/exclude PPN 11%
DP	Persentase atau jumlah Down Payment
Prepared by / Approver	PIC yang menyiapkan dan yang menandatangani
Add Cost?	Centang jika ini adalah quotation tambahan di luar quotation utama

B. Cara Membuat Quotation

1	Buka menu Quotation di navigasi utama Atau dari tab Quotation di halaman detail project
2	Klik + Buat Quotation Isi data dasar: nama klien, nama event, tanggal, lokasi
3	Pilih Divisi (EO atau PH) Nomor quotation akan mengikuti divisi yang dipilih
4	Susun Seksi dan Item Setiap seksi (A, B, C...) berisi item-item dengan rate, qty, dan hari
5	Atur Agency Fee & PPN Centang opsi yang berlaku
6	Atur DP (Down Payment) Isi persentase atau jumlah DP jika ada termin pembayaran
7	Pilih Prepared by dan Approver PIC yang menyiapkan & nama Direktur yang akan menandatangani
8	Hubungkan ke Project Pilih project yang terkait agar otomatis tersinkron
9	Simpan sebagai Draft Setelah isi lengkap, simpan — status jadi DRAFT

C. Alur Approval Quotation

Quotation harus melalui alur approval sebelum bisa dikirim ke klien dan sebelum project dinyatakan WON. Berikut alur lengkapnya:

Status	Siapa yang Bertindak	Yang Dilakukan	Keterangan
DRAFT	PM / Pembuat Quotation	Menyusun isi quotation	Bisa diedit bebas, belum dikirim ke siapapun
PENDING WULAN (Menunggu Review)	Wulan (Admin/Koordinator)	Mengecek kelengkapan dokumen, format dan substansi	PM klik Substansi status berubah ke Pending Wulan
PENDING DIREKTUR (Menunggu Approval)	Direktur Divisi	Menyetujui nilai penawaran dan isi quotation	Wulan klik Approve status berubah ke Direktur Divisi
APPROVED ✓	Siap dikirim ke klien	Quotation siap dicetak/dikirim ke klien	Direktur Divisi klik Approve → status APPROVED
WON ✓✓	PM	Klik Mark as WON setelah klien konfirmasi	Otomatis: item quotation masuk ke Forecast Budget
LOST ✕	PM	Klik Mark as LOST jika pitch gagal	Project diperbarui ke status LOSE, evaluasi diisi

■ Quotation yang sudah APPROVED atau WON tidak bisa dihapus. Jika perlu revisi, gunakan fitur **Kembalikan ke Draft (hanya Owner/Direktur)**.

✓ Pastikan quotation sudah dihubungkan ke project sebelum di-mark WON, agar Forecast Budget otomatis terbentuk.

D. Quotation Add Cost

Add Cost adalah quotation tambahan untuk biaya di luar quotation utama. Ini terjadi ketika klien meminta penambahan item/layanan setelah kontrak utama sudah disepakati, dan memerlukan nomor invoice terpisah.

Aspek	Quotation Utama	Quotation Add Cost
Nomor Quotation	WTM/EO/QUOT/2026/001	WTM/EO/QUOT/2026/002 (nomor baru)
Nomor Invoice	1 invoice utama	Invoice terpisah (2 invoice berbeda ke klien)
Forecast Budget	Item masuk ke forecast project	Item DITAMBAHKAN ke forecast yang sama (tidak menggantikan)
Label di Forecast	Nama item original	[Add Cost WTM/.../002] Nama Item (ada prefix)
Approval	Alur sama: Submit → Wulan → Direktur	Alur sama: Submit → Wulan → Direktur

Cara membuat Quotation Add Cost:

- Buat quotation baru seperti biasa
- Centang opsi "**Ini adalah Quotation Add Cost**" di bagian atas form
- Hubungkan ke project yang sama dengan quotation utama
- Isi item-item tambahan, submit, dan ikuti alur approval
- Setelah WON, item akan otomatis ditambahkan (append) ke Forecast Budget yang sudah ada

E. Revisi Quotation yang Sudah WON

Jika ada perubahan signifikan setelah quotation WON (misalnya perubahan scope atau negosiasi ulang), Direktur/Owner bisa membuka kembali quotation untuk revisi.

- Direktur/Owner klik **Kembalikan ke Draft** pada quotation yang berstatus WON
- PM edit isi quotation sesuai perubahan yang disepakati
- Submit ulang → alur approval berjalan dari awal (Wulan → Direktur)
- Setelah di-approve dan di-mark WON lagi, **Forecast Budget otomatis diperbarui**
- Catatan: Item yang sudah ada Pengajuan Pembayaran (PR) tidak akan dihapus — aman

■ Hanya Owner dan Direktur yang bisa membuka kembali quotation WON ke status Draft.

7. Forecast Budget — Rencana Kebutuhan Dana

Forecast Budget adalah **rencana pengeluaran project** yang menjadi acuan kebutuhan dana. Finance melihat forecast ini untuk memastikan **ketersediaan dana sesuai tanggal yang dibutuhkan**. Semakin detail dan akurat forecast, semakin lancar proses persetujuan pembayaran.

A. Mengapa Forecast Penting?

Antisipasi Ketersediaan Dana	Finance bisa mempersiapkan dana sebelum tanggal pembayaran tiba — tidak mendadak
Acuan Margin Project	Selisih antara nilai quotation dan total forecast = estimasi profit project
Dasar Pengajuan Pembayaran	Setiap Payment Request harus berasal dari item yang ada di forecast
Transparansi & Kontrol	Direktur dan Finance bisa melihat rencana pengeluaran seluruh project

B. Sinkronisasi Otomatis dari Quotation

Ketika PM menandai quotation sebagai **WON**, sistem secara otomatis membuat item-item di Forecast Budget berdasarkan item dalam quotation tersebut. **Tidak perlu input manual**.

Quotation (Item Penawaran)	→	Forecast Budget (Rencana Pengeluaran)
Seksi A: Sound System Item 1: Main PA System Rp 15.000.000 Item 2: Monitor Speaker Rp 3.000.000	→	Item Forecast: • Main PA System — Rp 15.000.000 • Monitor Speaker — Rp 3.000.000
Seksi B: Venue Item 1: Sewa Ballroom Rp 25.000.000	→	Item Forecast: • Sewa Ballroom — Rp 25.000.000
[Add Cost] Seksi C: Deco Item 1: Extra Dekorasi Rp 5.000.000	→	[Add Cost WTM/.../002] Extra Dekorasi — Rp 5.000.000 (ditambahkan, tidak mengganti)

C. Menambah & Mengedit Item Forecast

Item dari quotation adalah **titik awal**, bukan titik akhir. PM bebas menambah detail yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aktual.

Item dari Quotation	Bisa Dipecah/Ditambah di Forecast Menjadi
Stationery & Print Rp 2.000.000	• Print A4 untuk Signage (50 lembar) • Print Banner 3x1m • Nota & Amplop • Name Tag Peserta
Dekorasi Rp 5.000.000	• DP Bunga & Greenery (bayar D-7) • Pelunasan Dekorasi (bayar H-1) • Dekorasi Panggung Tambahan
Talent & Entertainer Rp 8.000.000	• DP MC (50% — bayar D-14) • Pelunasan MC (50% — bayar H) • Honorarium Band

Cara menambah/mengedit item di Forecast:

- Buka halaman detail project → tab **Budget**

- Klik **" + Tambah baris "** untuk item baru, atau klik baris yang ada untuk edit
- Item yang ditambah manual bisa dihapus kapan saja (selama belum ada PR)
- Item dari quotation bisa diedit namanya/nilainya sesuai kebutuhan aktual

D. Kolom Penting di Forecast

Kolom	Keterangan	Tips Pengisian
Label	Nama komponen biaya	Spesifik — tulis nama vendor/item yang jelas
Qty & Satuan	Jumlah dan satuan	Contoh: 1 unit, 50 lembar, 3 hari
Harga Satuan	Harga per unit	Sesuai penawaran vendor
Forecast (Rp)	Total estimasi biaya (qty × harga)	Otomatis terhitung
Aktual Modal	Biaya yang benar-benar dibayar	Diisi setelah pembayaran terjadi
Tanggal Butuh	Kapan dana ini harus tersedia	PENTING: isi akurat agar Finance bisa siapkan dana tepat waktu
Kategori	Jenis pengeluaran (lihat tabel kategori)	Pilih yang paling sesuai
Modal Awal	Centang jika ini DP/uang muka	Untuk identifikasi pengeluaran awal project
Titipan	Centang jika biaya titipan klien	Tidak dihitung sebagai modal Watermark

E. Kategori Pengeluaran

Kode	Label	Contoh Penggunaan
TICKET_TRANSPORT	Tiket & Transport	Pesawat, kereta, sewa kendaraan, BBM
ACCOMMODATION	Akomodasi	Hotel tim, per diem
VENUE_DP	DP Venue	Uang muka sewa venue/ballroom
VENUE_FINAL	Pelunasan Venue	Pelunasan sewa venue
VENDOR_DP	DP Vendor	Uang muka ke vendor sound/lighting/catering
VENDOR_FINAL	Pelunasan Vendor	Pelunasan tagihan vendor
TALENT_HONOR	Talent / Honor	MC, performer, narasumber, fotografer
OPERATIONAL_OTHER	Operasional Lain	ATK, print, konsumsi tim, dll

✓ Isi kolom "Tanggal Butuh" dengan tepat. Finance menggunakan data ini untuk merencanakan ketersediaan kas. Jika tanggal butuh tidak diisi, pengajuan PR bisa lebih lama diproses.

8. Pengajuan Pembayaran (Payment Request)

Payment Request (PR) adalah **permohonan resmi kepada Finance** untuk membayarkan tagihan vendor atau biaya operasional project. Setiap PR harus terhubung ke item yang ada di Forecast Budget dan melewati alur approval sebelum dibayarkan.

A. Cara Membuat Payment Request

1	Buka halaman detail project Tab Budget
2	Temukan item yang ingin diajukan pembayarannya Misalnya: "DP Venue Ballroom — Rp 10.000.000"
3	Klik tombol ■ Ajukan Bayar di baris item tersebut Tombol muncul jika belum ada PR aktif di item itu
4	Isi detail pengajuan: Jumlah yang diajukan, keterangan/memo, nama vendor/penerima
5	Upload bukti tagihan (invoice vendor) Opsional tapi sangat dianjurkan — mempercepat approval
6	Klik Submit PR langsung masuk ke alur approval

B. Alur Approval Payment Request

PR melewati **tiga tahap approval** sebelum Finance mengeksekusi pembayaran. Setiap tahap dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk memastikan kontrol pengeluaran.



4

FINANCE EKSEKUSI PEMBAYARAN

Finance Staff melakukan transfer dan menandai PR sebagai PAID

- Finance melakukan transfer ke rekening vendor
- Upload bukti transfer
- Status PR berubah ke PAID
- Nilai Aktual Modal di item forecast otomatis terisi

C. Status PR & Artinya

Status	Arti	Siapa yang Bisa Mengubah
PENDING_DIRECTOR	Menunggu persetujuan Direktur Divisi	Direktur Divisi (approve/tolak)
PENDING_FINANCE_DIRECTOR	Menunggu persetujuan Direktur Finance	Direktur Finance (approve/tolak)
APPROVED_BY_DIRECTOR	Sudah disetujui, menunggu eksekusi Finance	Finance Staff (eksekusi bayar)
PAID ✓	Pembayaran sudah dilakukan	Otomatis setelah Finance upload bukti bayar
REJECTED ✗	Ditolak — lihat keterangan penolakan	PM bisa buat PR baru setelah perbaikan

D. Tips agar Pembayaran Cepat Diproses

- **Isi "Tanggal Butuh" dengan akurat di Forecast** — Finance memprioritaskan PR berdasarkan urgensi tanggal kebutuhan dana. Jika kosong, PR Anda bisa digeser ke belakang.
- **Sertakan invoice vendor** — PR dengan bukti tagihan lebih cepat diapprove karena tidak perlu klarifikasi.
- **Tulis memo yang jelas** — "DP 50% sewa ballroom Hotel XYZ, event 15 Juli 2026" lebih baik dari "bayar vendor".
- **Ajukan PR jauh-jauh hari sebelum deadline pembayaran** — alur 3 tahap bisa memakan 1-3 hari kerja. Jangan mendadak.
- **Pisahkan DP dan pelunasan** — buat dua item terpisah di forecast (VENDOR_DP dan VENDOR_FINAL) dengan tanggal butuh masing-masing.
- **Cek notifikasi sistem** — jika PR ditolak, segera cek keterangan dan perbaiki.

E. Rangkuman Alur Lengkap

■ PR yang ditolak tidak bisa diedit — PM perlu membuat PR baru. Baca keterangan penolakan dengan teliti sebelum mengajukan ulang.

9. Tim Project

Tab **Tim** untuk mengelola anggota tim yang terlibat dalam project.

Menambah Anggota Tim

- Klik **+ Tambah Anggota** di tab Tim
- Cari dan pilih nama dari daftar tim
- Anggota dapat langsung melihat dan mengerjakan task di project ini

Workload Score

Status Project	Beban PIC	Beban Anggota
HOLD	0	0
PITCHING	1x	0.5x
WAITING RESULT	1x	0
PREPARATION	1x	1x
EVENT_DAY	1.5x	1.5x
REPORTING	1x	0.5x
INVOICING	0.5x	0

✓ Tambahkan semua anggota yang terlibat agar workload tercatat akurat di dashboard tim.

10. Client Brief

Tab **Brief** menyediakan template pertanyaan terstruktur untuk brief klien.

Template EVENT mencakup:

- Tujuan utama event (Brand awareness / Launch / Lead generation / dll)
- KPI utama yang ingin dicapai
- Target audience dan profil peserta
- Format event yang diinginkan
- Aktivitas utama di dalam event
- Lokasi & kebutuhan operasional
- Konsep visual & tema yang diinginkan
- Budget range yang dimiliki klien
- Timeline dan deadline

Template PH mencakup:

- Jenis produksi (corporate profile, commercial, dokumentasi, dll)
- Target audience konten
- Pesan utama yang ingin disampaikan
- Referensi visual / mood board
- Durasi konten
- Platform distribusi
- Timeline produksi
- Budget range

✓ Isi brief sedetail mungkin — ini menjadi dokumen referensi untuk seluruh tim dan meminimalisir miskomunikasi dengan klien.

11. Catatan Evaluasi Tim

Setelah project selesai (DONE) atau pitch gagal (LOSE), isi catatan evaluasi untuk pembelajaran tim.

Untuk Project WON/DONE

- Apa yang berjalan baik?
- Apa yang bisa diperbaiki?
- Kendala yang dihadapi dan solusinya
- Nilai kepuasan klien (1-5)
- Catatan untuk project serupa di masa depan

Untuk Project LOSE

- Alasan pitch gagal (harga, konsep, persaingan, dll)
- Apa yang bisa diperbaiki dari proposal?
- Upload surat pengumuman klien (PDF) jika ada — tombol upload tersedia di bagian bawah section

■ Evaluasi yang tidak diisi akan mempengaruhi skor KPI tim. Isi sebelum project ditutup.

12. Vendor & Klien

Database Vendor

Semua vendor yang pernah digunakan tersimpan di modul Vendor. PM bisa:

- Melihat riwayat kerja sama per vendor
- Melihat rating dan catatan dari project sebelumnya
- Menambah vendor baru ke database
- Mencatat evaluasi setelah kerja sama

Database Klien

Modul Klien menyimpan profil dan histori project per klien:

- Nama PIC klien dan kontak
- Histori semua project yang pernah dikerjakan bersama
- Total nilai project dan status pembayaran

✓ Selalu cari vendor/klien di database sebelum menambah baru — hindari duplikasi data.

13. Piutang & Invoice

Modul Piutang dikelola terutama oleh Finance, namun PM perlu memahami alurnya.

Status Invoice/Piutang	Arti	Tindakan PM
UNPAID	Invoice sudah dikirim, belum ada pembayaran	Follow up klien jika mendekati due date
PARTIAL	Ada sebagian pembayaran masuk	Konfirmasi ke Finance nominal yang diterima
PAID	Lunas	Tandai project DONE jika semua milestone selesai
OVERDUE	Melewati jatuh tempo	Koordinasi dengan Finance dan klien untuk penyelesaian

Invoice dibuat oleh Finance dari data quotation yang sudah WON. PM tidak perlu membuat invoice secara manual.

14. Penilaian Tim

Modul Penilaian untuk KPI dan evaluasi performa tim.

Dua Jenis Penilaian:

Jenis	Keterangan	Siapa yang mengisi
Penilaian per Project	Evaluasi kontribusi setiap anggota setelah project selesai	PIC/PM untuk anggotanya
KPI Bulanan	Penilaian performa bulanan berdasarkan target dan capaian	Direktur / atasan langsung

Hasil penilaian bisa dilihat di profil masing-masing anggota dan di dashboard KPI.

15. Dashboard & Workload

Dashboard memberikan gambaran real-time kondisi seluruh project dan tim.

Yang bisa dilihat di Dashboard:

- Ringkasan project aktif per status
- Project yang mendekati deadline
- Payment Request yang pending approval
- Notifikasi terbaru

Workload Tim

Halaman Workload menampilkan beban kerja setiap anggota tim berdasarkan project aktif mereka:

- Semakin tinggi score, semakin sibuk orang tersebut
- Berguna saat assign PIC untuk project baru — pilih yang workload-nya rendah
- Project berstatus HOLD tidak menghitung workload

16. Tips & Referensi Cepat

Golden Rules untuk PM/Produser

✓ Buat Quotation → Hubungkan ke Project	Jangan lupa link quotation ke project yang benar agar Forecast otomatis terbentuk saat WON
✓ Isi Tanggal Butuh di Forecast	Finance sangat bergantung pada ini untuk merencanakan kas. Tanpa ini, pembayaran bisa terlambat
✓ Ajukan PR Jauh-Jauh Hari	Alur 3 approval (Direktur Divisi → Direktur Finance → Eksekusi) bisa 1-3 hari kerja
✓ Update Status Project Secara Real-Time	Status yang tidak diupdate membuat laporan dan workload tim tidak akurat
✓ Isi Evaluasi Setelah Project	Evaluasi adalah data berharga untuk perbaikan. Wajib diisi sebelum project ditutup
✓ Pisahkan DP dan Pelunasan di Forecast	Buat dua baris terpisah dengan kategori VENDOR_DP dan VENDOR_FINAL — masing-masing dengan tanggal butuh berbeda

Shortcut & Navigasi Cepat

Ingin...	Caranya
Buat quotation baru	Menu Quotation → + Buat Quotation
Lihat semua quotation project	Halaman detail project → tab Quotation
Tambah item manual ke forecast	Detail project → tab Budget → + Tambah baris
Ajukan pembayaran	Detail project → tab Budget → klik  Ajukan Bayar di item
Cek status PR yang sudah diajukan	Detail project → tab Budget → lihat status di kolom PR
Ubah status project	Halaman detail project → klik status badge di header
Lihat workload tim	Menu Workload Tim di navigasi
Cek piutang klien	Menu Finance → Piutang

Panduan ini dibuat berdasarkan sistem Watermark PM versi aktif Juni 2026. Jika ada pertanyaan atau menemukan perbedaan dengan tampilan sistem, hubungi tim pengembang.
