

# Panduan Lengkap Project Manager & Produser

Mencakup alur lengkap: Brief → Quotation → Approval → Forecast Budget Pengajuan Pembayaran → Invoice → Selesai

Versi 2.0 · Juni 2026

## DAFTAR ISI

---

1. Gambaran Sistem
2. Alur Kerja Utama: Brief → Quotation → Done
3. Membuat Project Baru
4. Status Project & Kapan Mengubahnya
5. Manajemen Task
6. **ALUR QUOTATION — Penawaran ke Klien**
  - › Apa itu Quotation?
  - › Membuat Quotation
  - › Alur Approval Quotation (Draft → Disetujui Direktur)
  - › Quotation Add Cost
  - › Revisi Quotation yang Sudah WON
7. **FORECAST BUDGET — Rencana Kebutuhan Dana**
  - › Mengapa Forecast Penting?
  - › Sinkronisasi Otomatis dari Quotation
  - › Menambah & Mengedit Item Forecast
  - › Kategori Pengeluaran
  - › Titipan Klien
8. **PENGAJUAN PEMBAYARAN (Payment Request)**
  - › Cara Membuat Payment Request
  - › Alur Approval PR: PM → Direktur Divisi → Direktur Finance
  - › Status PR & Artinya
  - › Tips agar Pembayaran Cepat Diproses
9. Tim Project
10. Client Brief
11. Catatan Evaluasi Tim
12. Vendor & Klien
13. Piutang & Invoice
14. Penilaian Tim

15. Dashboard & Workload

16. Tips & Referensi Cepat

# 1. Gambaran Sistem

Watermark PM adalah sistem manajemen project internal yang mencakup semua tahapan operasional — dari brief masuk, pitching, pelaksanaan event, hingga penagihan dan evaluasi.


| Modul     | Fungsi Utama                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projects  | Pusat kendali: task, budget, tim, dokumen, evaluasi                              |
| Quotation | Buat & kelola penawaran harga kepada klien — terintegrasi dengan Forecast Budget |
| Invoice   | Kelola penagihan kepada klien                                                    |
| Finance   | Piutang, laporan margin, rekap forecast keuangan                                 |
| Vendor    | Database vendor dengan riwayat kerja sama & rating                               |
| Klien     | Database klien dan histori project                                               |
| Penilaian | KPI bulanan & penilaian per-project                                              |
| Workload  | Monitoring beban kerja tim secara real-time                                      |

**Divisi:**

- Event (EO) — Meeting & Conference, Activation, Launching, Exhibition, Incentive & Gathering, Sponsorship
- Production House (PH) — Corporate Profile, Commercial, Event Documentation, Social Media Content, Training Video, Motion Graphic

## 2. Alur Kerja Utama: Brief → Quotation → Done

Berikut adalah gambaran besar alur kerja dari pertama kali brief masuk hingga project selesai. Detail setiap tahapan ada di bagian masing-masing.

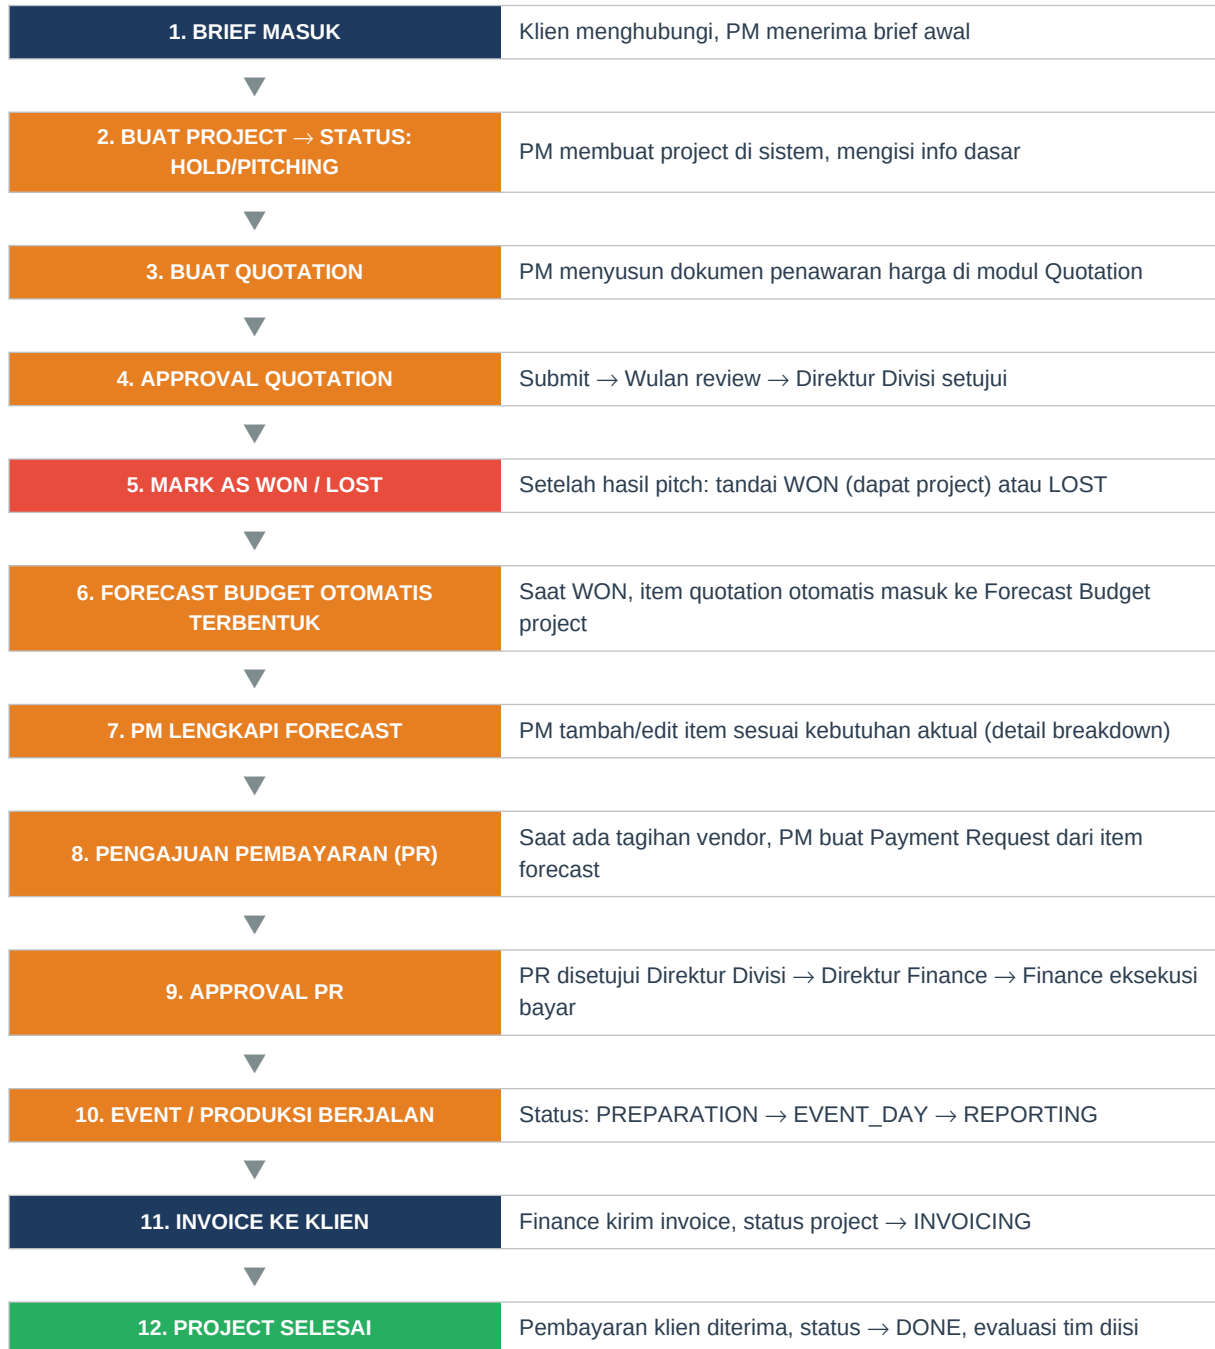

### 3. Membuat Project Baru

| Field wajib saat membuat project:                           |
|-------------------------------------------------------------|
| • Nama Project — nama event/produksi yang deskriptif        |
| • Divisi — EVENT atau PH (menentukan jenis sub-kategori)    |
| • Sub-kategori — jenis event/produksi (pilih dari dropdown) |
| • PIC (Project Manager yang bertanggung jawab)              |
| • Tanggal event / jadwal produksi                           |

| Field         | Keterangan                         | Wajib?   |
|---------------|------------------------------------|----------|
| Nama Project  | Nama event/produksi                | ✓        |
| Divisi        | EVENT atau PH                      | ✓        |
| Sub-kategori  | Jenis event/produksi               | ✓        |
| PIC           | PM yang bertanggung jawab          | ✓        |
| Client Name   | Nama klien (bisa diisi belakangan) |          |
| Tanggal Event | Jadwal pelaksanaan                 |          |
| Kode Project  | Otomatis di-generate sistem        | otomatis |

---

## 4. Status Project & Kapan Mengubahnya

| Status               | Arti                                   | Kapan pindah ke status ini                  |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| HOLD                 | Brief masuk, belum mulai proses        | Saat project pertama dibuat                 |
| PITCHING             | Sedang menyiapkan proposal/quotation   | Saat mulai proses pitch ke klien            |
| WAITING_PITCH_RESULT | Proposal sudah dikirim, menunggu hasil | Setelah proposal/quotation dikirim ke klien |
| PREPARATION          | Project diterima (WON), mulai eksekusi | Setelah konfirmasi WIN dari klien           |
| EVENT_DAY            | Hari pelaksanaan event/shoot           | Di hari H event atau produksi               |
| REPORTING            | Pasca event, menyiapkan laporan        | Setelah event/produksi selesai              |
| INVOICING            | Invoice sudah dikirim ke klien         | Setelah invoice dikirim, menunggu bayar     |
| DONE                 | Project selesai dan lunas              | Setelah pembayaran klien diterima           |
| LOSE                 | Pitch gagal, project tidak jadi        | Saat konfirmasi kalah dari klien            |
| FAILED               | Project gagal di tengah jalan          | Jarang — hanya untuk kasus darurat          |
| CANCELLED            | Project dibatalkan                     | Saat klien cancel sebelum mulai             |

---

## 5. Manajemen Task

Tab **Task** adalah papan kanban untuk memantau pekerjaan dalam project.

| Kolom       | Arti                     |
|-------------|--------------------------|
| TODO        | Task belum dikerjakan    |
| IN PROGRESS | Sedang dikerjakan        |
| REVIEW      | Perlu review/persetujuan |
| DONE        | Selesai                  |

### Membuat Task

- Klik tombol **+ Tambah Task**
- Isi judul task
- Assign ke anggota tim (bisa lebih dari satu)
- Set deadline jika perlu
- Tambah deskripsi / sub-task jika diperlukan

### Priority Task

| Priority | Kapan digunakan                   |
|----------|-----------------------------------|
| LOW      | Pekerjaan rutin, tidak mendesak   |
| MEDIUM   | Pekerjaan standar                 |
| HIGH     | Mendesak, harus selesai segera    |
| URGENT   | Darurat, butuh perhatian langsung |

## 6. Alur Quotation — Penawaran ke Klien

Quotation adalah **dokumen penawaran harga resmi** yang dikirimkan kepada klien. Di sistem Watermark PM, quotation bukan sekadar dokumen — ia menjadi **dasar otomatis terbentuknya Forecast Budget** project. Karena itu, isi quotation harus sedetail dan seakurat mungkin.

### A. Apa itu Quotation?

| Komponen               | Keterangan                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nomor Quotation        | Digenerate otomatis: WTM/EO/QUOT/2026/001                          |
| Client & Event         | Nama klien, nama event, tanggal, lokasi                            |
| Seksi & Item           | Daftar komponen biaya per seksi (A, B, C, ...)                     |
| Agency Fee             | Persentase fee (jika ada)                                          |
| PPN                    | Pilihan include/exclude PPN 11%                                    |
| DP                     | Persentase atau jumlah Down Payment                                |
| Prepared by / Approver | PIC yang menyiapkan dan yang menandatangani                        |
| Add Cost?              | Centang jika ini adalah quotation tambahan di luar quotation utama |

### B. Cara Membuat Quotation

|   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Buka menu <b>Quotation</b> di navigasi utama<br>Atau dari tab Quotation di halaman detail project     |
| 2 | Klik + <b>Buat Quotation</b><br>Isi data dasar: nama klien, nama event, tanggal, lokasi               |
| 3 | Pilih <b>Divisi</b> (EO atau PH)<br>Nomor quotation akan mengikuti divisi yang dipilih                |
| 4 | Susun <b>Seksi dan Item</b><br>Setiap seksi (A, B, C...) berisi item-item dengan rate, qty, dan hari  |
| 5 | Atur <b>Agency Fee &amp; PPN</b><br>Centang opsi yang berlaku                                         |
| 6 | Atur <b>DP</b> (Down Payment)<br>Isi persentase atau jumlah DP jika ada termin pembayaran             |
| 7 | Pilih <b>Prepared by dan Approver</b><br>PIC yang menyiapkan & nama Direktur yang akan menandatangani |
| 8 | Hubungkan ke <b>Project</b><br>Pilih project yang terkait agar otomatis tersinkron                    |
| 9 | <b>Simpan</b> sebagai Draft<br>Setelah isi lengkap, simpan — status jadi DRAFT                        |

### C. Alur Approval Quotation



Quotation harus melalui alur approval sebelum bisa dikirim ke klien dan sebelum project dinyatakan WON. Berikut alur lengkapnya:

| Status           | PIC                            | Keterangan & Tindakan                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAFT            | PM / Pembuat                   | Isi dan edit bebas. Klik "Ajukan ke Wulan" jika sudah siap diajukan.                                                                         |
| PENDING WULAN    | Wulan (Senior PM)              | Wulan cek kelengkapan dan format quotation. Jika OK klik "Checked — Wulan". Jika perlu revisi, PM/Producer klik tombol Revisi.               |
| PENDING DIREKTUR | Direktur Divisi (David / Guna) | Direktur Divisi setuju nilai dan isi penawaran. Klik "Approved — David" (EO) atau "Approved — Guna" (PH). Jika perlu revisi, PM klik Revisi. |
| APPROVED         | PM                             | Quotation siap dicetak dan dikirim ke klien. PM bisa upload Dokumen Bertandatangan (PDF yang sudah ditandatangani).                          |
| WON              | PM                             | PM klik Mark as WON setelah klien konfirmasi deal. OTOMATIS: seluruh item quotation langsung masuk ke Forecast Budget project.               |
| LOST             | PM                             | PM klik Mark as LOST jika pitch gagal. Project berubah ke status LOSE, isi evaluasi dan upload surat pengumuman dari klien.                  |

■ Quotation yang sudah **APPROVED** atau **WON** tidak bisa dihapus, namun PM/Producer bisa klik tombol **Revisi** untuk mengembalikan ke Draft. Notifikasi otomatis dikirim ke Senior PM dan Direktur terkait.

✓ Pastikan quotation sudah dihubungkan ke project yang benar sebelum di-mark WON — Forecast Budget project akan otomatis terisi dari item quotation tersebut.

## D. Quotation Add Cost

**Add Cost** adalah quotation tambahan untuk biaya di luar quotation utama. Ini terjadi ketika klien meminta penambahan item/layanan setelah kontrak utama sudah disepakati, dan memerlukan nomor invoice terpisah.

| Aspek             | Quotation Utama                      | Quotation Add Cost                                          |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomor Quotation   | WTM/EO/QUOT/2026/001                 | WTM/EO/QUOT/2026/002 (nomor baru)                           |
| Nomor Invoice     | 1 invoice utama                      | Invoice terpisah (2 invoice berbeda ke klien)               |
| Forecast Budget   | Item masuk ke forecast project       | Item DITAMBAHKAN ke forecast yang sama (tidak menggantikan) |
| Label di Forecast | Nama item original                   | [Add Cost WTM/.../002] Nama Item (ada prefix)               |
| Approval          | Alur sama: Submit → Wulan → Direktur | Alur sama: Submit → Wulan → Direktur                        |

### Cara membuat Quotation Add Cost:

- Buat quotation baru seperti biasa
- Centang opsi "**Ini adalah Quotation Add Cost**" di bagian atas form
- Hubungkan ke project yang sama dengan quotation utama
- Isi item-item tambahan, submit, dan ikuti alur approval
- Setelah WON, item akan otomatis ditambahkan (append) ke Forecast Budget yang sudah ada

## E. Revisi Quotation yang Sudah WON

Jika ada perubahan signifikan setelah quotation WON (misalnya perubahan scope atau negosiasi ulang), Direktur/Owner bisa membuka kembali quotation untuk revisi.

- Direktur/Owner klik **Kembalikan ke Draft** pada quotation yang berstatus WON
- PM edit isi quotation sesuai perubahan yang disepakati
- Submit ulang → alur approval berjalan dari awal (Wulan → Direktur)
- Setelah di-approve dan di-mark WON lagi, **Forecast Budget otomatis diperbarui**
- Catatan: Item yang sudah ada Pengajuan Pembayaran (PR) tidak akan dihapus — aman

■ Hanya Owner dan Direktur yang bisa membuka kembali quotation WON ke status Draft.

## 7. Forecast Budget — Rencana Kebutuhan Dana

Forecast Budget adalah **rencana pengeluaran project** yang menjadi acuan kebutuhan dana. Finance melihat forecast ini untuk memastikan **ketersediaan dana sesuai tanggal yang dibutuhkan**. Semakin detail dan akurat forecast, semakin lancar proses persetujuan pembayaran.

### A. Mengapa Forecast Penting?

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Antisipasi Ketersediaan Dana | Finance bisa mempersiapkan dana sebelum tanggal pembayaran tiba — tidak mendadak |
| Acuan Margin Project         | Selisih antara nilai quotation dan total forecast = estimasi profit project      |
| Dasar Pengajuan Pembayaran   | Setiap Payment Request harus berasal dari item yang ada di forecast              |
| Transparansi & Kontrol       | Direktur dan Finance bisa melihat rencana pengeluaran seluruh project            |

### B. Sinkronisasi Otomatis dari Quotation

Ketika PM menandai quotation sebagai **WON**, sistem secara otomatis membuat item-item di Forecast Budget berdasarkan item dalam quotation tersebut. **Tidak perlu input manual**.

| Quotation (Item Penawaran)                                                                            | → | Forecast Budget (Rencana Pengeluaran)                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Seksi A: Sound System<br>Item 1: Main PA System Rp 15.000.000<br>Item 2: Monitor Speaker Rp 3.000.000 | → | Item Forecast:<br>• Main PA System — Rp 15.000.000<br>• Monitor Speaker — Rp 3.000.000 |
| Seksi B: Venue<br>Item 1: Sewa Ballroom Rp 25.000.000                                                 | → | Item Forecast:<br>• Sewa Ballroom — Rp 25.000.000                                      |
| [Add Cost] Seksi C: Deco<br>Item 1: Extra Dekorasi Rp 5.000.000                                       | → | [Add Cost WTM/.../002] Extra Dekorasi<br>— Rp 5.000.000 (ditambahkan, tidak mengganti) |

### C. Menambah & Mengedit Item Forecast

Item dari quotation adalah **titik awal**, bukan titik akhir. PM bebas menambah detail yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aktual.

| Item dari Quotation               | Bisa Dipecah/Ditambah di Forecast Menjadi                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationery & Print Rp 2.000.000   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Print A4 untuk Signage (50 lembar)</li><li>• Print Banner 3x1m</li><li>• Nota &amp; Amplop</li><li>• Name Tag Peserta</li></ul> |
| Dekorasi Rp 5.000.000             | <ul style="list-style-type: none"><li>• DP Bunga &amp; Greenery (bayar D-7)</li><li>• Pelunasan Dekorasi (bayar H-1)</li><li>• Dekorasi Panggung Tambahan</li></ul>     |
| Talent & Entertainer Rp 8.000.000 | <ul style="list-style-type: none"><li>• DP MC (50% — bayar D-14)</li><li>• Pelunasan MC (50% — bayar H)</li><li>• Honorarium Band</li></ul>                             |

**Cara menambah/mengedit item di Forecast:**

- Buka halaman detail project → tab **Budget**

- Klik "+ **Tambah baris**" untuk item baru, atau klik baris yang ada untuk edit
- Item yang ditambah manual bisa dihapus kapan saja (selama belum ada PR)
- Item dari quotation bisa diedit namanya/nilainya sesuai kebutuhan aktual

## D. Kolom Penting di Forecast

| Kolom         | Keterangan                               | Tips Pengisian                                                        |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Label         | Nama komponen biaya                      | Spesifik — tulis nama vendor/item yang jelas                          |
| Qty & Satuan  | Jumlah dan satuan                        | Contoh: 1 unit, 50 lembar, 3 hari                                     |
| Harga Satuan  | Harga per unit                           | Sesuai penawaran vendor                                               |
| Forecast (Rp) | Total estimasi biaya (qty × harga)       | Otomatis terhitung                                                    |
| Aktual Modal  | Biaya yang benar-benar dibayar           | Diisi setelah pembayaran terjadi                                      |
| Tanggal Butuh | Kapan dana ini harus tersedia            | <b>PENTING: isi akurat agar Finance bisa siapkan dana tepat waktu</b> |
| Kategori      | Jenis pengeluaran (lihat tabel kategori) | Pilih yang paling sesuai                                              |
| Modal Awal    | Centang jika ini DP/uang muka            | Untuk identifikasi pengeluaran awal project                           |
| Titipan       | Centang jika biaya titipan klien         | Tidak dihitung sebagai modal Watermark                                |

## E. Kategori Pengeluaran

| Kode              | Label             | Contoh Penggunaan                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| TICKET_TRANSPORT  | Tiket & Transport | Pesawat, kereta, sewa kendaraan, BBM        |
| ACCOMMODATION     | Akomodasi         | Hotel tim, per diem                         |
| VENUE_DP          | DP Venue          | Uang muka sewa venue/ballroom               |
| VENUE_FINAL       | Pelunasan Venue   | Pelunasan sewa venue                        |
| VENDOR_DP         | DP Vendor         | Uang muka ke vendor sound/lighting/catering |
| VENDOR_FINAL      | Pelunasan Vendor  | Pelunasan tagihan vendor                    |
| TALENT_HONOR      | Talent / Honor    | MC, performer, narasumber, fotografer       |
| OPERATIONAL_OTHER | Operasional Lain  | ATK, print, konsumsi tim, dll               |

✓ Isi kolom "Tanggal Butuh" dengan tepat. Finance menggunakan data ini untuk merencanakan ketersediaan kas. Jika tanggal butuh tidak diisi, pengajuan PR bisa lebih lama diproses.

## 8. Pengajuan Pembayaran (Payment Request)

Payment Request (PR) adalah **permohonan resmi kepada Finance** untuk membayarkan tagihan vendor atau biaya operasional project. Setiap PR harus terhubung ke item yang ada di Forecast Budget dan melewati alur approval sebelum dibayarkan.

### A. Cara Membuat Payment Request

|   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Buka halaman detail project</b><br>Tab <b>Budget</b>                                                       |
| 2 | <b>Temukan item yang ingin diajukan pembayarannya</b><br>Misalnya: "DP Venue Ballroom — Rp 10.000.000"        |
| 3 | <b>Klik tombol ■ Ajukan Bayar di baris item tersebut</b><br>Tombol muncul jika belum ada PR aktif di item itu |
| 4 | <b>Isi detail pengajuan:</b><br>Jumlah yang diajukan, keterangan/memo, nama vendor/penerima                   |
| 5 | <b>Upload bukti tagihan (invoice vendor)</b><br>Opsional tapi sangat dianjurkan — mempercepat approval        |
| 6 | <b>Klik Submit</b><br>PR langsung masuk ke alur approval                                                      |

### B. Alur Approval Payment Request

PR melewati **tiga tahap approval** sebelum Finance mengeksekusi pembayaran. Setiap tahap dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk memastikan kontrol pengeluaran.



## 4

**FINANCE EKSEKUSI PEMBAYARAN**

Finance Staff melakukan transfer dan menandai PR sebagai PAID

- Finance melakukan transfer ke rekening vendor
- Upload bukti transfer
- Status PR berubah ke PAID
- Nilai Aktual Modal di item forecast otomatis terisi

**C. Status PR & Artinya**

| Status                   | Arti                                       | Siapa yang Bisa Mengubah                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PENDING_DIRECTOR         | Menunggu persetujuan Direktur Divisi       | Direktur Divisi (approve/tolak)             |
| PENDING_FINANCE_DIRECTOR | Menunggu persetujuan Direktur Finance      | Direktur Finance (approve/tolak)            |
| APPROVED_BY_DIRECTOR     | Sudah disetujui, menunggu eksekusi Finance | Finance Staff (eksekusi bayar)              |
| PAID ✓                   | Pembayaran sudah dilakukan                 | Otomatis setelah Finance upload bukti bayar |
| REJECTED ✗               | Ditolak — lihat keterangan penolakan       | PM bisa buat PR baru setelah perbaikan      |

**D. Tips agar Pembayaran Cepat Diproses**

- **Isi "Tanggal Butuh" dengan akurat di Forecast** — Finance memprioritaskan PR berdasarkan urgensi tanggal kebutuhan dana. Jika kosong, PR Anda bisa digeser ke belakang.
- **Sertakan invoice vendor** — PR dengan bukti tagihan lebih cepat diapprove karena tidak perlu klarifikasi.
- **Tulis memo yang jelas** — "DP 50% sewa ballroom Hotel XYZ, event 15 Juli 2026" lebih baik dari "bayar vendor".
- **Ajukan PR jauh-jauh hari sebelum deadline pembayaran** — alur 3 tahap bisa memakan 1-3 hari kerja. Jangan mendadak.
- **Pisahkan DP dan pelunasan** — buat dua item terpisah di forecast (VENDOR\_DP dan VENDOR\_FINAL) dengan tanggal butuh masing-masing.
- **Cek notifikasi sistem** — jika PR ditolak, segera cek keterangan dan perbaiki.

**E. Rangkuman Alur Lengkap**

■ PR yang ditolak tidak bisa diedit — PM perlu membuat PR baru. Baca keterangan penolakan dengan teliti sebelum mengajukan ulang.

## 9. Tim Project

Tab **Tim** untuk mengelola anggota tim yang terlibat dalam project.

### Menambah Anggota Tim

- Klik + **Tambah Anggota** di tab Tim
- Cari dan pilih nama dari daftar tim
- Anggota dapat langsung melihat dan mengerjakan task di project ini

### Workload Score

| Status Project | Beban PIC | Beban Anggota |
|----------------|-----------|---------------|
| HOLD           | 0         | 0             |
| PITCHING       | 1x        | 0.5x          |
| WAITING RESULT | 1x        | 0             |
| PREPARATION    | 1x        | 1x            |
| EVENT_DAY      | 1.5x      | 1.5x          |
| REPORTING      | 1x        | 0.5x          |
| INVOICING      | 0.5x      | 0             |

✓ Tambahkan semua anggota yang terlibat agar workload tercatat akurat di dashboard tim.

---

## 10. Client Brief

Tab **Brief** menyediakan template pertanyaan terstruktur untuk brief klien.

### Template EVENT mencakup:

- Tujuan utama event (Brand awareness / Launch / Lead generation / dll)
- KPI utama yang ingin dicapai
- Target audience dan profil peserta
- Format event yang diinginkan
- Aktivitas utama di dalam event
- Lokasi & kebutuhan operasional
- Konsep visual & tema yang diinginkan
- Budget range yang dimiliki klien
- Timeline dan deadline

### Template PH mencakup:

- Jenis produksi (corporate profile, commercial, dokumentasi, dll)
- Target audience konten
- Pesan utama yang ingin disampaikan
- Referensi visual / mood board
- Durasi konten
- Platform distribusi
- Timeline produksi
- Budget range

✓ Isi brief sedetail mungkin — ini menjadi dokumen referensi untuk seluruh tim dan meminimalisir miskomunikasi dengan klien.



---

## 11. Catatan Evaluasi Tim

Setelah project selesai (DONE) atau pitch gagal (LOSE), isi catatan evaluasi untuk pembelajaran tim.

### Untuk Project WON/DONE

- Apa yang berjalan baik?
- Apa yang bisa diperbaiki?
- Kendala yang dihadapi dan solusinya
- Nilai kepuasan klien (1-5)
- Catatan untuk project serupa di masa depan

### Untuk Project LOSE

- Alasan pitch gagal (harga, konsep, persaingan, dll)
- Apa yang bisa diperbaiki dari proposal?
- Upload surat pengumuman klien (PDF) jika ada — tombol upload tersedia di bagian bawah section

■ Evaluasi yang tidak diisi akan mempengaruhi skor KPI tim. Isi sebelum project ditutup.

---

## 12. Vendor & Klien

### Database Vendor

Semua vendor yang pernah digunakan tersimpan di modul Vendor. PM bisa:

- Melihat riwayat kerja sama per vendor
- Melihat rating dan catatan dari project sebelumnya
- Menambah vendor baru ke database
- Mencatat evaluasi setelah kerja sama

### Database Klien

Modul Klien menyimpan profil dan histori project per klien:

- Nama PIC klien dan kontak
- Histori semua project yang pernah dikerjakan bersama
- Total nilai project dan status pembayaran

✓ Selalu cari vendor/klien di database sebelum menambah baru — hindari duplikasi data.

---

## 13. Piutang & Invoice

Modul Piutang dikelola terutama oleh Finance, namun PM perlu memahami alurnya.

| Status Invoice/Piutang | Arti                                        | Tindakan PM                                            |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UNPAID                 | Invoice sudah dikirim, belum ada pembayaran | Follow up klien jika mendekati due date                |
| PARTIAL                | Ada sebagian pembayaran masuk               | Konfirmasi ke Finance nominal yang diterima            |
| PAID                   | Lunas                                       | Tandai project DONE jika semua milestone selesai       |
| OVERDUE                | Melewati jatuh tempo                        | Koordinasi dengan Finance dan klien untuk penyelesaian |

Invoice dibuat oleh Finance dari data quotation yang sudah WON. PM tidak perlu membuat invoice secara manual.

---

## 14. Penilaian Tim

Modul Penilaian untuk KPI dan evaluasi performa tim.

### Dua Jenis Penilaian:

| Jenis                 | Keterangan                                                 | Siapa yang mengisi         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Penilaian per Project | Evaluasi kontribusi setiap anggota setelah project selesai | PIC/PM untuk anggotanya    |
| KPI Bulanan           | Penilaian performa bulanan berdasarkan target dan capaian  | Direktur / atasan langsung |

Hasil penilaian bisa dilihat di profil masing-masing anggota dan di dashboard KPI.

---

## 15. Dashboard & Workload

Dashboard memberikan gambaran real-time kondisi seluruh project dan tim.

### Yang bisa dilihat di Dashboard:

- Ringkasan project aktif per status
- Project yang mendekati deadline
- Payment Request yang pending approval
- Notifikasi terbaru

### Workload Tim

Halaman Workload menampilkan beban kerja setiap anggota tim berdasarkan project aktif mereka:

- Semakin tinggi score, semakin sibuk orang tersebut
- Berguna saat assign PIC untuk project baru — pilih yang workload-nya rendah
- Project berstatus HOLD tidak menghitung workload

## 16. Tips & Referensi Cepat

### Golden Rules untuk PM/Produser

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ <b>Buat Quotation →<br/>Hubungkan ke Project</b>  | Jangan lupa link quotation ke project yang benar agar Forecast otomatis terbentuk saat WON                      |
| ✓ <b>Isi Tanggal Butuh di<br/>Forecast</b>          | Finance sangat bergantung pada ini untuk merencanakan kas. Tanpa ini, pembayaran bisa terlambat                 |
| ✓ <b>Ajukan PR Jauh-Jauh Hari</b>                   | Alur 3 approval (Direktur Divisi → Direktur Finance → Eksekusi) bisa 1-3 hari kerja                             |
| ✓ <b>Update Status Project<br/>Secara Real-Time</b> | Status yang tidak diupdate membuat laporan dan workload tim tidak akurat                                        |
| ✓ <b>Isi Evaluasi Setelah Project</b>               | Evaluasi adalah data berharga untuk perbaikan. Wajib diisi sebelum project ditutup                              |
| ✓ <b>Pisahkan DP dan<br/>Pelunasan di Forecast</b>  | Buat dua baris terpisah dengan kategori VENDOR_DP dan VENDOR_FINAL — masing-masing dengan tanggal butuh berbeda |

### Shortcut & Navigasi Cepat

| Ingin...                          | Caranya                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Buat quotation baru               | Menu Quotation → + Buat Quotation                         |
| Lihat semua quotation project     | Halaman detail project → tab Quotation                    |
| Tambah item manual ke forecast    | Detail project → tab Budget → + Tambah baris              |
| Ajukan pembayaran                 | Detail project → tab Budget → klik ■ Ajukan Bayar di item |
| Cek status PR yang sudah diajukan | Detail project → tab Budget → lihat status di kolom PR    |
| Ubah status project               | Halaman detail project → klik status badge di header      |
| Lihat workload tim                | Menu Workload Tim di navigasi                             |
| Cek piutang klien                 | Menu Finance → Piutang                                    |

*Panduan ini dibuat berdasarkan sistem Watermark PM versi aktif Juni 2026. Jika ada pertanyaan atau menemukan perbedaan dengan tampilan sistem, hubungi tim pengembang.*
